


10・11月工程表


部 位	10月	11月	備 考
校舎工事	外・基礎工事 電気・機械設備工事	1階から家具工事・床貼り工事 遮断工工事	
	外壁・窓枠工事 電気・機械設備工事	1階から家具工事・床貼り工事 遮断工工事	
体育施設工事	外壁・窓枠工事 電気・機械設備工事	1階から家具工事・床貼り工事 遮断工工事	
環境整備工事	外壁・窓枠工事 電気・機械設備工事	1階から家具工事・床貼り工事 遮断工工事	



体育館内部の状況写真です。

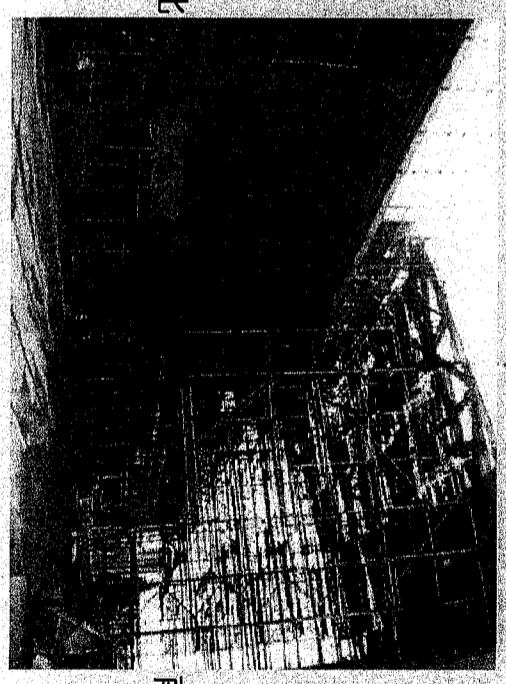

体育館西面の状況写真です。

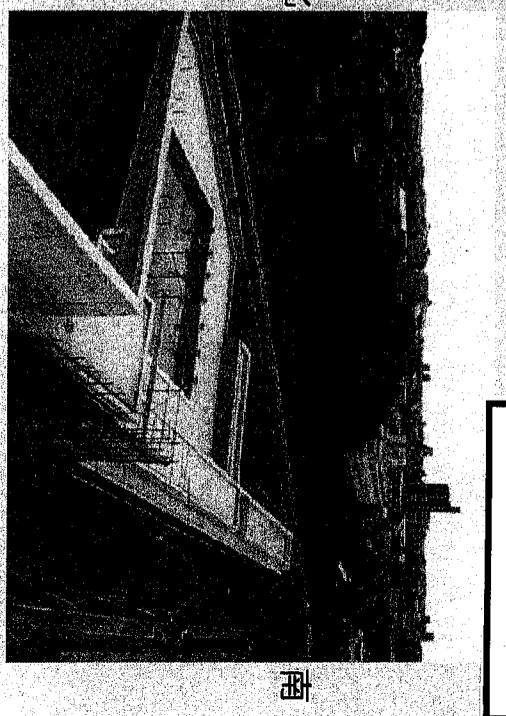


トール・クラーブハウスの状況写真です。




校舎3階教室の状況写真です。




校舎大屋根の状況写真です。



校舎1階特別支援学級の状況写真です。



校舎4階の状況写真です。

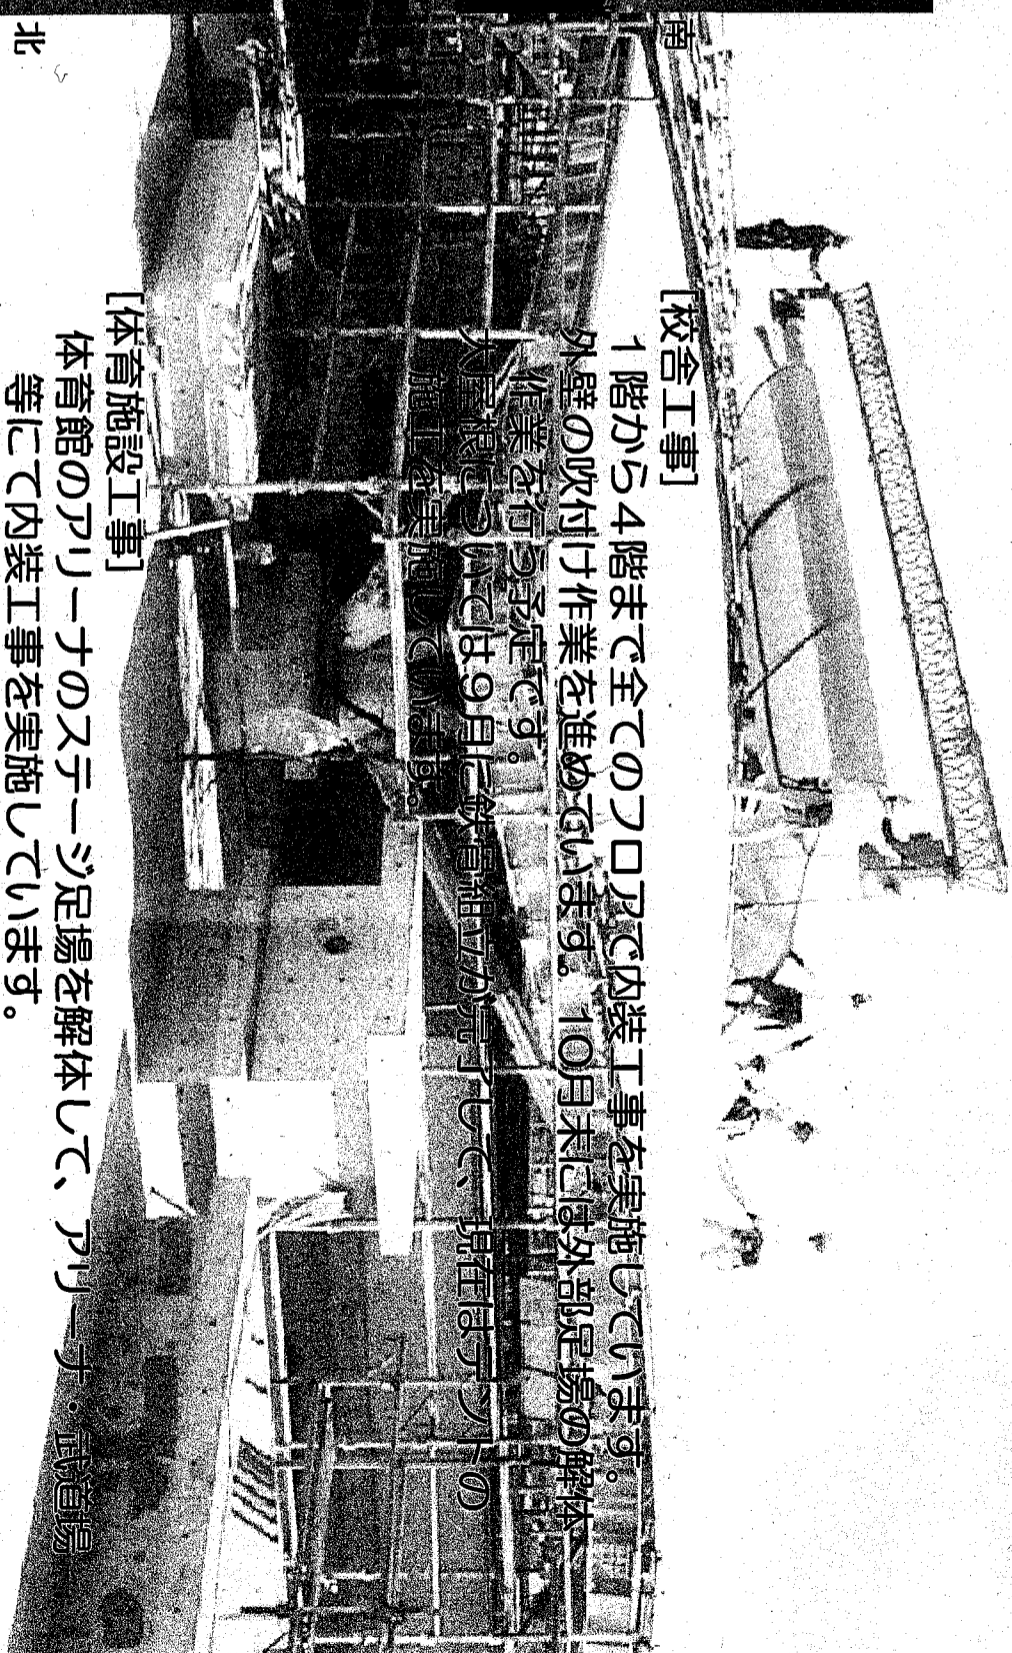

【校舎工事】

1階から4階まで全てのフロアで内装工事を実施しています。外壁の吹付け作業を進めています。10月末には外部足場の解体作業を行う予定です。10月末には外部足場の解体作業を行います。10月末には外部足場の解体作業を行います。10月末には外部足場の解体作業を行います。

【体育施設工事】

体育館のフリーナのステージ足場を解体して、フリーナ・武道場等にて内装工事を実施しています。外壁の仕上げも実施し10月下旬からは外部足場の解体の予定です。10月中旬からは雨水排水管等の敷設を開始します。
