

平成29年度事業実施スケジュール表  
 (繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備 考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
【一般会計分】 建設部区画整理課 公園西駅周辺区画整理関 連事業 59,632千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う周辺の整備に関する事業について、工事3件と移設事業を繰越し実施する。  ○交差点改良工事 57,060千円 ・道路改良工事-----①-1 ・都市計画道路改良工事その1---①-2 ・12-2号線他道路改良工事-----①-3  ○移設事業 2,572千円 ・電柱支障移設	○交差点改良工事												
		工事	完了検査 支払											
		○移設事業												
		補償金 完了確認 支払												
変更・延期等が生じた理由	○交差点改良工事 ※三件の交差点改良工事について、工期内での完了が困難となったため、工期延長をすることとなる。 ・道路改良工事 市道内に移設する農業用水の改築を、水田の取水が不要となる10月末以降での施工とせざるを得なくなったため12月上旬の工事完了となる。 ・都市計画道路改良工事その1 県道田駒名古屋線との交差点部において、県が施工する用水路の移設が11月となり、その後、歩道部の表層を施工する手順となるため、12月上旬の工事完了となる。 ・12-2号線他道路改良工事 蛭子橋の架け替えで仮設橋を設置して工事を進めており、前後の道路築造の工程調整も図ったが、仮設橋撤去が9月末までとなり、周辺の用水移設が撤去後となることから、12月上旬の工事完了となる。													

**平成29年度事業実施スケジュール表**  
**(繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。**

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
【特別会計(土地区画整理事業)分] 建設部区画整理課 街区整備事業 313,208千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う街区等の整備に関する事業について、工事7件と水道負担金を繰越し実施する。													
	○街区整備工事 189,302千円													
	・道路擁壁他工事-----②													
	・6-6号線他道路改良工事-----③													
	・都市計画道路改良工事その1-----①-2													
・都市計画道路改良工事その2-----④														
・12-2号線他道路改良工事-----①-3														
・護岸改修工事-----⑤														
○駅前広場整備工事 54,373千円														
・駅前広場整備工事-----⑥														
○供給処理施設負担金 69,533千円														
・水道2条2項(事業地内工事)-----⑦														
・水道2条2項(丸山橋添架工事)---⑧														
変更・延期等が生じた理由	<p>○街区整備工事 ※街区整備工事の内、下記2件の工事について、工期内での完了が困難となったため、工期延長をすることとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画道路改良工事その1 県道田名古屋線との交差点部において、県が施工する用水路の移設が11月となり、その後、歩道部の表層を施工する手順となるため、12月上旬の工事完了となる。</li> <li>・12-2号線他道路改良工事 蛭子橋の架け替えで仮設橋を設置して工事を進めており、前後の道路築造の工程調整も図ったが、仮設橋撤去が9月末までとなり、周辺の用水路移設が撤去後となることから、12月上旬の工事完了となる。</li> </ul>													

平成29年度事業実施スケジュール表  
 (繰越明許・継続費・主要事業) ※該当に○を付けてください。

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
【特別会計(土地区画整理事業)分】 建設部土地区画整理課 建物等移転補償事業 78,850千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴う建物移転等事業について、建物移転2件(3名)と水道、ガスの移設を繰越し実施する。  ○建物移転補償費 35,113千円 ・2件(3人)-----⑨  ○移設事業 43,737千円 ・水道移設(蛭子橋)-----⑩ ・ガス移設(蛭子橋)-----⑪														
変更・延期等が生じた理由	※上記について、スケジュールの変更はない。														

**平成29年度事業実施スケジュール表**  
**繰越明許・継続費・主要事業）※該当に○を付けてください。**

課等名 事業名 H29予算額	事業内容	年間スケジュール												備 考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
【特別会計(関連事業)分】 建設部区画整理課 環境配慮施策事業 36,945千円	公園西駅周辺土地区画整理事業の施行に伴い実施する環境配慮施策工事(※車道部の遮熱性舗装及び歩道部の遮熱保水性ブロック)4件と、調整池修景施設設計委託1件を繰越し実施する。  ○調整池修景設計委託 6,900千円 ・調整池修景設計委託-----⑫  ○環境配慮施策工事 30,045千円 ・都市計画道路改良工事その1--⑬-1 ・都市計画道路改良工事その2--⑬-2 ・6-6号線他道路改良工事-----⑬-3 ・12-2号線他道路改良工事-----⑬-4	○調整池修景設計委託													完了検査 支払
		設計													
		○環境配慮施策工事													
		工事													
変更・延期等が生じた理由	○環境配慮施策工事 環境配慮施策工事は、地区内及び地区外の道路改良工事に合わせて、歩道部の遮熱保水性ブロック舗装を関連事業として施工するものであり、上記4件(工期延長はしない都市計画道路改良工事その2と6-6号線他道路改良工事含む)の工事において、歩道部の遮熱保水性ブロック舗装は実施スケジュールどおり完了するが、他部分(道路路盤工、用水路移設など)の工事も含めた契約形態であり、その部分での工期延長に伴い、完了検査と支払が12月末頃となる。														

平成29年度事業実施スケジュール表（繰越明許分） 詳細説明資料


番号	事業内容	繰越明許における工期	契約額(円)	後金相当額(円)	変更後完了時期(予定)	契約額の増減額(予定)	備考
		繰越理由			変更(工期延長)理由		
①-1 (P1)	【一般会計】交差点改良工事 道路改良工事	H29.1.20～H29.8.18	28,296,000	16,996,000	H29 12月上旬	5,000千円増額	
		地区外の交差点改良について、地権者との用地買収交渉に相当の時間を要したため、繰越しするもの。			市道内に移設する農業用水の改築を、水田の取水が不要となる10月末以降での施工とせざるを得なくなったため、12月上旬の工事完了となる。		
①-2 (P1)	【一般会計】交差点改良工事 都市計画道路改良工事その1	H29.1.20～H29.9.27	16,663,680	8,663,680	H29 12月上旬	1,000千円増額	
		愛知県が施工する県道田名古屋線の南側交差点改良工事との施工工程調整により、繰越しするもの。			県道田名古屋線との交差点部において、県が施工する用水路の移設が11月となり、その後、歩道部の表層を施工する手順となるため、12月上旬の工事完了となる。		
①-3 (P1)	【一般会計】交差点改良工事 12-2号線他道路改良工事	H29.2.16～H29.9.15	21,264,720	21,264,720	H29 12月上旬	増減なし	
		愛知県が施工する県道田名古屋線の北側交差点改良工事との施工工程調整により、繰越しするもの。			蛭子橋の架け替えで仮設橋を設置して工事を進めており、前後の道路築造の工程調整も図ったが、仮設橋撤去が9月末までとなり、周辺の用水移設が撤去後となることから、12月上旬の工事完了となる。		
①-2 (P2)	【特別会計】街区整備工事 都市計画道路改良工事その1	H29.1.20～H29.9.27	2,906,930	2,906,930	H29 12月上旬	増減なし	
		予算編成時には想定できなかった想定外の地中埋設物の出土による工事費増加を受け、工事実施が平成28年度12月の補正予算後となったことにより、繰越しするもの。			県道田名古屋線との交差点部において、県が施工する用水路の移設が11月となり、その後、歩道部の表層を施工する手順となるため、12月上旬の工事完了となる。		
①-3 (P2)	【特別会計】街区整備工事 12-2号線他道路改良工事	H29.2.16～H29.9.15	54,380,280	19,780,280	H29 12月上旬	20,000千円増額	
		予算編成時には想定できなかった造成計画の見直しに伴う道路擁壁工事の設置を受け、工事実施が平成28年度12月の補正予算後となったことにより、繰越しするもの。			蛭子橋の架け替えで仮設橋を設置して工事を進めており、前後の道路築造の工程調整も図ったが、仮設橋撤去が9月末までとなり、周辺の用水移設が撤去後となることから、12月上旬の工事完了となる。		
⑬-1 (P4)	【特別会計】環境配慮施策工事 都市計画道路改良工事その1	H29.1.20～H29.9.27	463,390	463,390	H29 12月上旬	増減なし	
		平成28年度12月補正後に年度を繰り越して発注した工事と一体で施工する必要があることから、繰越しするもの。			対象工事の歩道部遮熱保水性ブロック舗装は、繰越明許時に示した実施スケジュールどおり完了するが、本工事は他部分(道路の路盤工、側溝敷設、用水路移設)も含めた契約形態であり、その部分での工期延長に伴い、完了検査と支払が12月末頃となる。		
⑬-4 (P4)	【特別会計】環境配慮施策工事 12-2号線他道路改良工事	H29.2.16～H29.9.15	11,079,000	11,079,000	H29 12月上旬	増減なし	
		平成28年度12月補正後に年度を繰り越して発注した工事と一体で施工する必要があることから、繰越しするもの。			対象工事の歩道部遮熱保水性ブロック舗装は、繰越明許時に示した実施スケジュールどおり完了するが、本工事は他部分(道路の路盤工、側溝敷設、用水路移設)も含めた契約形態であり、その部分での工期延長に伴い、完了検査と支払が12月末頃となる。		

工事名	契約金(円)	前払金(円)	後金相当額(円)
道路改良工事	28,296,000	11,300,000	16,996,000
都市計画道路改良工事その1	20,034,000	8,000,000	12,034,000
12-2号線他道路改良工事	86,724,000	34,600,000	52,124,000

※各工事とも工期延長についての変更契約手続中  
 ※現時点で、契約額は変更していないが、工事によっては、工事内容の変更により、工期完了時に契約額の変更を予定



# 公園西駅周辺土地区画整理事業工事箇所

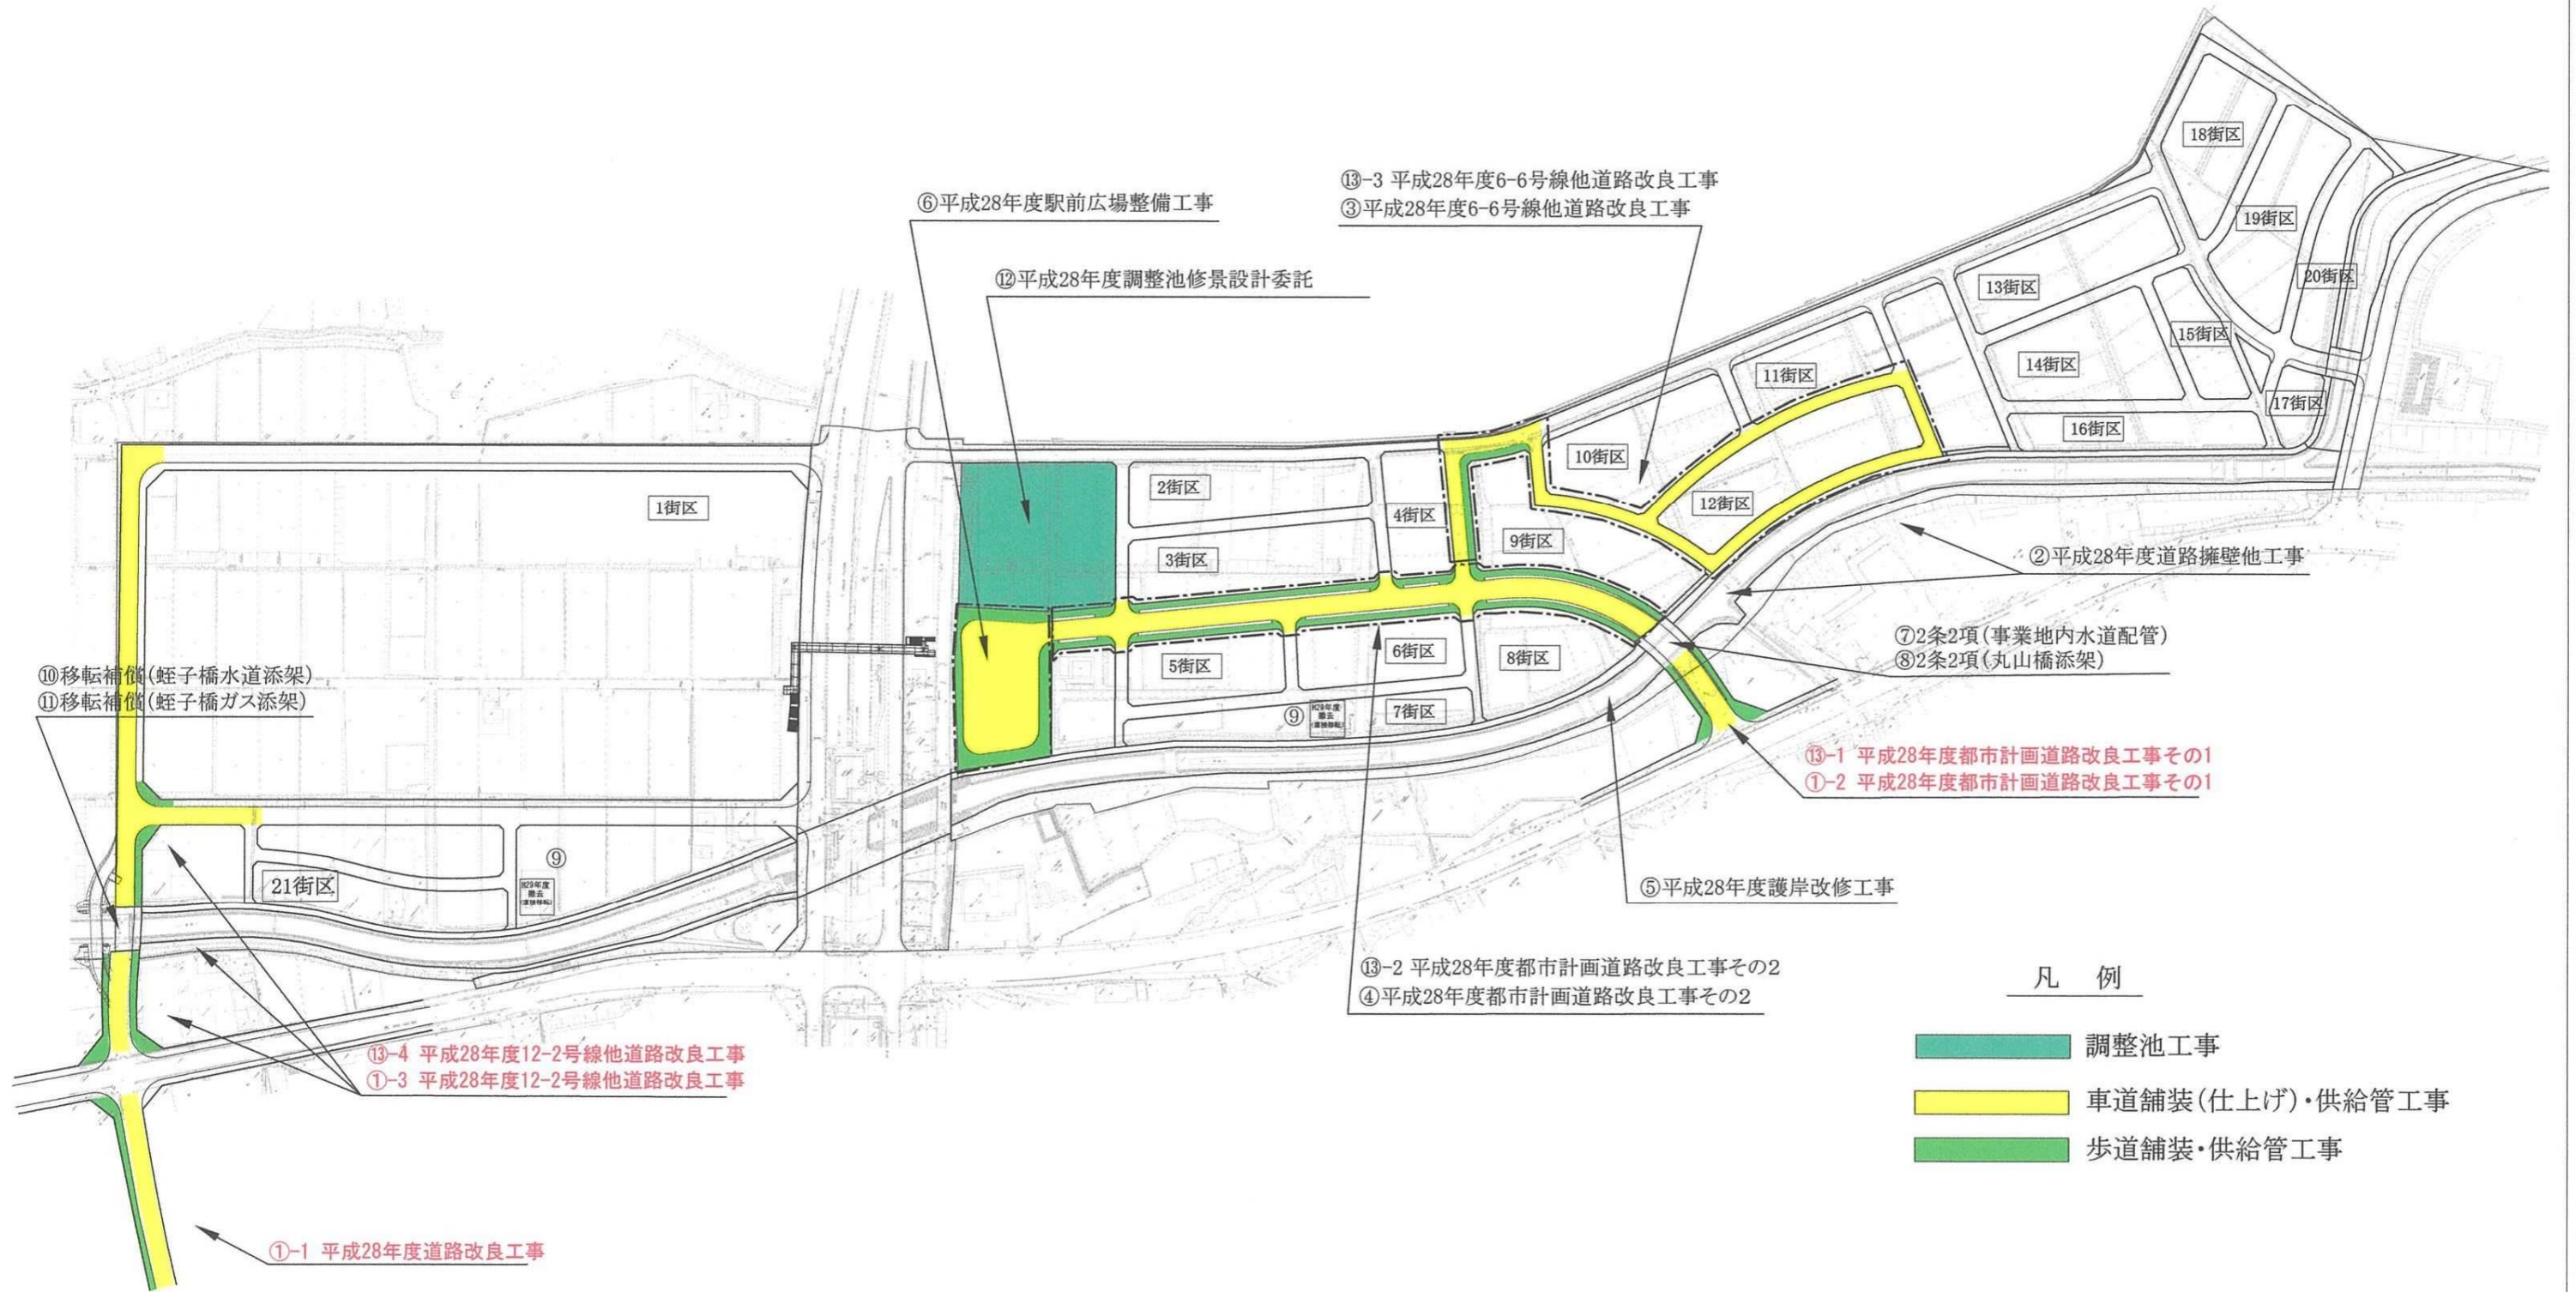

## 凡例

- 調整池工事
- 車道舗装(仕上げ)・供給管工事
- 歩道舗装・供給管工事
