

令和5年度主要事業の進捗状況について

予算決算委員会  
令和5年11月2日  
総務部 財政課

政策	事業名	担当課	頁
● 子どもが元気に育つまち			
	民間保育施設整備事業	子ども未来課	2
	保育園ICT推進事業	子ども未来課	2
	養育費履行確保事業	子ども家庭課	3
	学校情報機器整備事業	教育総務課	3
	高等学校等入学支援事業	教育総務課	4
	西小学校施設大規模改修事業	教育総務課	4
	長久手小学校施設大規模改修事業	教育総務課	5
	南小学校施設大規模改修事業	教育総務課	5
● みんなで未来につなぐ 緑はまちの宝物			
	剪定枝粉砕機無償貸出事業	みどりの推進課	6
	アグリサポート事業	みどりの推進課	6
	香流川緑地整備事業	みどりの推進課	7
● 誰もがいきいきと安心して暮らせるまち			
	非常備消防自動車購入事業	安心安全課	7
	文化の家特定天井改修事業	生涯学習課	8
	岩作旧市街地狭あい道路整備事業	土木課	8

政策	事業名	担当課	頁
● いつでも どこでも 誰とでも 広がる交流の輪			
	歴史民俗体験施設整備事業	生涯学習課	9
	古戦場公園再整備事業	生涯学習課	9
● あえて歩いてみたくなるまち			
	Nーバス購入事業	安心安全課	10
	旧香流苑清算事業	環境課	10
	卯塚墓園整備事業	環境課	11
	保健センター外壁補修事業	健康推進課	11
	宮前3号線舗装修繕事業	土木課	12
	雁又泥亀首1号線道路改良事業	土木課	12
	せせらぎの径修繕事業	みどりの推進課	13

主要事業進捗状況報告書

事業名	民間保育施設整備事業			予算額（千円）	390,000
担当部課等名	子ども部子ども未来課			負担行為済額（千円）	0
事業概要	令和6年4月に、新たに民設民営の保育園2園を開園します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	390,000
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫補助金（就学前教育・保育施設整備交付金）の協議</li> <li>・保育園の建築に向けた周辺住民への挨拶</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保育園の建築開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保護者向け入園案内のため、保育園の園児の受け入れ体制を確認し、市ホームページ更新及び入園案内を配布</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開園に向け、入園する園児を決定</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交付申請を終え、国からの内示を受理しました。</li> <li>・保育園事業者が、周辺住民へ説明を行いました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保育園が建築業者を選定し、建築を開始しました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	保育園ICT推進事業			予算額（千円）	11,944
担当部課等名	子ども部子ども未来課			負担行為済額（千円）	10,200
事業概要	公営の保育園6園で、保育園ICTシステムを新たに導入し、QRコードを利用した登降園打刻、欠席連絡、園からのお知らせ等の配信を行います。システム導入により、園児の出欠や保護者との連絡をペーパーレスで実施し、利便性の向上につなげます。			執行済額（千円）	6,921
				残額（千円）	1,744
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募によるシステム業者選定</li> <li>・WiFi環境整備工事の入札</li> <li>・備品の入札</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム業者との打合せ</li> <li>・WiFi環境整備工事実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各保育園にタブレット機器を配布し、保育士向けのシステム操作説明会を開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保育園で、システムのテスト運用を開始</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロポーザルを実施し、システム業者を選定しました。</li> <li>・WiFi環境整備工事の入札及び備品の入札を行い、業者と契約を締結しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システム業者と、運用に関する打合せを行いました。</li> <li>・WiFi環境整備工事を実施しました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	養育費履行確保事業			予算額（千円）	270
担当部課等名	子ども部子ども家庭課			負担行為済額（千円）	0
事業概要	養育費の取り決めにかかる費用を市が負担し、養育費の継続的な支払いの確保を目指し、ひとり親世帯の経済的安定を図ります。 ①公正証書等作成促進事業補助金（上限40,000円） 補助対象：養育費に関する公正証書等の作成費用（公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て等に要する収入印紙代等） ②養育費保証促進事業補助金（上限50,000円） 補助対象：保証会社との養育費保証契約に対して支払った初年度契約料			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	270
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・事業実施準備	・制度啓発 ・申請受付	・制度啓発 ・申請受付	・制度啓発 ・申請受付	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>要綱を制定しました。</li> <li>市HPに事業に関するページを掲載しました。</li> <li>出先機関に啓発チラシを設置しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童扶養手当受給者への現況審査結果通知送付時に啓発チラシを同封しました。</li> <li>現時点で実績はありませんが、事業に関する相談が2件ありました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	学校情報機器整備事業（小中学校大型提示装置購入）			予算額（千円）	107,936
担当部課等名	教育部教育総務課			負担行為済額（千円）	96,483
事業概要	GIGAスクール構想において整備したタブレット端末の活用を促進するため、個別学習だけでなく、画面共有を主体とした情報共有・集団学習、デジタル教材の活用が可能となるよう大型提示装置（電子黒板）を整備し、ICT教育環境の拡大をはかり、教育指導の幅を広げます。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	11,453
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・物品納入業者の決定・契約	・各校へ設置を完了			
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>6月19日に教育産業(株)と96,482,496円(税込)で物品の売買契約を締結し、準備を開始しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスプレイ型大型提示装置 61台、プロジェクター型大型提示装置202台の設置を完了し、授業で活用しています。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	高等学校等入学支援事業			予算額（千円）	7,154
担当部課等名	教育部教育総務課			負担行為済額（千円）	5,538
事業概要	高等学校等に入学した生徒（学生）を養育する人に対し、入学支援金10,000円を支給します。			執行済額（千円）	5,538
				残額（千円）	1,616
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象者へ案内を送付</li> <li>月締めで支給決定、支払</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>月締めで支給決定、支払</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>月締めで支給決定、支払</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>月締めで支給決定、支払</li> <li>1月31日で受付終了</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>5/2案内を送付しました。</li> <li>6月支給 380人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7月支給 96人</li> <li>8月支給 32人</li> <li>9月支給 29人</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	西小学校施設大規模改修工事			予算額（千円）	366,564
担当部課等名	教育部教育総務課			負担行為済額（千円）	290,780
事業概要	西小学校の校舎は、建築から40年以上が経過し、雨漏りや壁のひび割れ、床・天井等の破損など施設の老朽化が進んでいるため、屋根・外壁・天井・内装・電気設備・機械設備等の改修工事を実施します。 令和5年度 改修工事（第2期）			執行済額（千円）	106,400
				残額（千円）	75,784
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事業者を決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>改修工事を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>改修工事を継続</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>改修工事を完了</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>改修工事は6月19日に(株)市川工務店と266,139,500円（税込）で、工事監理は(株)阿波設計事務所名古屋支店と12,540,000円（税込）で、それぞれ契約を締結し、準備を開始しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎改修工事を行っています。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	長久手小学校施設大規模改修事業			予算額（千円）	19,085
担当部課等名	教育部教育総務課			負担行為済額（千円）	10,890
事業概要	長久手小学校は、建築から50年以上経過し校舎が老朽化しており、改修工事を実施し、長寿命化を図る必要があります。躯体等の構造体も老朽化している恐れがあることから、詳細な調査（健全度調査及びアスベスト調査等）を実施し、今後、実施設計が行えるよう、基本設計業務を委託します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	8,195
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・設計業者を決定	・設計業務を実施	・設計業務を継続	・設計業務を完了	
実施内容	・6月28日に(株)阿波設計事務所名古屋支店と10,890,000円（税込）で契約を締結し、設計業務を開始しました。	・建物調査を開始し設計業務を実施しています。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	南小学校施設大規模改修工事			予算額（千円）	77,660
担当部課等名	教育部教育総務課			負担行為済額（千円）	64,832
事業概要	南小学校の校舎は、建築から30年以上が経過し、雨漏りや壁のひび割れなど施設の老朽化が進んでいるため、屋根及び外壁の改修工事を実施します。 令和5年度 改修工事（第3期）			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	12,828
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・工事業者を決定	・改修工事を実施	・改修工事を継続	・改修工事を完了	
実施内容	・改修工事は6月15日にジェイテクノ(株)と59,023,800円（税込）で、工事監理は(株)黒野建築設計事務所と5,808,000円（税込）で、それぞれ契約を締結し、準備を開始しました。	・校舎改修工事を実施しています。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	剪定枝粉碎機無償貸出事業			予算額（千円）	40
担当部課等名	建設部みどりの推進課			負担行為済額（千円）	40
事業概要	剪定枝粉碎機の無償貸出を行い、家庭での植栽の維持管理及び費用の負担を軽減し、民有地の緑化保全を推進します。			執行済額（千円）	40
				残額（千円）	0
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>剪定枝粉碎機購入</li> <li>貸出事業開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業周知</li> <li>貸出実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業周知</li> <li>貸出実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業周知</li> <li>貸出実施</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>剪定枝粉碎機を購入し、6月から貸出事業を実施しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>広報、チラシ、デジタルサイネージ、HP等で周知を行いました。</li> <li>9月までで、2件の貸出を行いました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	アグリサポート事業			予算額（千円）	7,193
担当部課等名	建設部みどりの推進課			負担行為済額（千円）	7,070
事業概要	アグリサポート事業の仕組みを導入し、農地のマッチング等、様々な人が行う農に関わる取組を応援します。			執行済額（千円）	2,518
				残額（千円）	123
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>6月より、以前より貸出を行っていた草刈機に加え、耕運機4台の貸出事業を開始し、周知を行う</li> <li>4月から新規で農アドバイザー事業（営農相談）を開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自走式草刈機を新規で購入し、貸出開始</li> <li>アグリサポート事業の事業内容について、PR実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アグリサポート事業PRチラシ作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRチラシ配布</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>6月から、耕運機4台の貸出を開始し、HP、広報、ニュース、デジタルサイネージ等で周知を行いました。</li> <li>6月までで営農相談を10件実施しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8月にアルミブリッジ、自走式草刈機を購入し、9月から貸出を開始しました。</li> <li>農アドバイザー事業に関する記事をHPに掲載しました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	香流川緑地整備事業			予算額（千円）	43,845
担当部課等名	建設部みどりの推進課			負担行為済額（千円）	0
事業概要	香流側緑地を活用した緑化施策を推進するため、香流川前熊橋周辺にポケットパークを整備します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	43,845
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・工事発注に向けた調整事務	・予算執行準備	・予算執行事務	・工事着手及び完了	
実施内容	・工事発注に向けた準備をしました。	・設計書等の準備を行いました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	非常備消防自動車購入事業			予算額（千円）	17,468
担当部課等名	くらし文化部安心安全課			負担行為済額（千円）	17,292
事業概要	市内消防団に配置している消防車両が老朽化しているため、計画的に更新を図ります。また、配備済み消防ポンプ自動車を廃止して、新たに普通自動車免許で運転でき、救助資機材と小型動力消防ポンプを常時積載できる多機能型消防ポンプ自動車を配置します。			執行済額（千円）	17,292
				残額（千円）	176
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・車両購入に向けた手続き	・契約、打ち合わせ	・中間検査	・納車	
実施内容	・入札に向けて仕様書等を作成しました。	・8月2日に入札、8月8日に平和機械株式会社と契約しました。その後、落札した業者と仕様書等の確認を実施しました。3月22日までに納車できるようスケジュールを再確認しました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	文化の家特定天井改修事業			予算額（千円）	40,299
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課			負担行為済額（千円）	32,890
事業概要	「劇場・音楽堂等の事業活性化のための取組に関する指針」及び建築基準法施行令の一部改正により、特定天井の改修工事を行い、利用者に安全で快適な空間を提供するため、実施設計業務を実施します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	7,409
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・契約事務	・現場調査、仕様の決定	・詳細設計図作成	・積算・実施設計図書作成完了	
実施内容	・文化の家特定天井改修工事等実施設計業務委託について6月14日に（有）香山建築研究所と32,890,000円で契約を締結しました。	・7月 第1回打合せにて、基本設計の内容・年間スケジュールを確認しました。 ・9月 第2回打合せにて、照明LED、昇降機改修、工事中の建物使用について確認しました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	岩作旧市街地狭あい道路整備事業			予算額（千円）	60,625
担当部課等名	建設部土木課			負担行為済額（千円）	0
事業概要	岩作地区生活道路整備基本計画に沿って、市道東島2号線を優先路線として、緊急車両の通行が困難な狭あい道路を解消するため、道路の拡幅整備を行います。（P14参照）			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	60,625
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・用地交渉	・用地交渉 ・工事発注準備	・工事発注	・工事完了	
実施内容	・用地取得に向けて交渉を行いました。	・用地取得に向けて交渉を行いました。 ・工事発注に向けて準備を行いました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	歴史民俗体験施設整備事業			予算額（千円）	28,765
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課			負担行為済額（千円）	25,571
事業概要	江戸時代後期の建築とされ、市内に現存する最古級の古民家を活用し、この地域の昔ながらのくらしや歴史民俗文化を後世に継承するため、古戦場公園に古民家を含む歴史民俗体験施設を整備します。			執行済額（千円）	15
				残額（千円）	3,194
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史民俗資料館基本設計業務委託、古民家等解体工事及び解体工事監理業務委託の発注準備</li> <li>市民の力を活かした古民家解体移築に向けたワークショップの内容検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史民俗資料館基本設計業務委託、古民家等解体工事及び解体工事監理業務委託の発注</li> <li>市民の力を活かした古民家解体移築に向けたワークショップの開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民の力を活かした古民家解体イベントの開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>古民家等解体工事の完了</li> <li>次年度の市民の力を活かした古民家建築に向けたワークショップの内容検討</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史民俗資料館基本設計業務委託、古民家等解体工事及び解体工事監理業務委託の発注に向けた準備を行いました。</li> <li>ワークショップの内容を決定しました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>歴史民俗資料館基本設計業務委託、古民家等解体工事及び解体工事監理業務委託を発注しました。</li> <li>7月、8月、9月にワークショップを開催し、延べ76人の市民が参加しました。市民が希望する解体作業内容について、意見を頂きました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	古戦場公園再整備事業			予算額（千円）	47,091
担当部課等名	くらし文化部生涯学習課			負担行為済額（千円）	5,014
事業概要	貴重な文化財である国指定史跡長久手古戦場の保存・継承及び長久手古戦場野外活動施設の活用の方の見直しも含めて、古戦場公園一帯を有効活用し、歴史の学びの場、体験の場及び交流の場の拠点として、古戦場公園を再整備します。			執行済額（千円）	5,014
				残額（千円）	42,077
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガイダンス施設建設工事（令和5年度～6年度継続工事）の発注準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガイダンス施設建設工事の発注</li> <li>古戦場公園再整備事業をPRするため、広報紙で7月から9月にかけて特集記事を掲載</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>樹木伐採工事及び築山切土造成工事の発注</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガイダンス建設工事の令和5年度分（東屋及び屋外トイレ撤去工事等）の完了</li> <li>樹木伐採工事及び築山切土造成工事の完了</li> </ul>	
実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガイダンス施設建設工事の発注に向けた事務を行いました。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9月6日にガイダンス施設建設工事の入札を行いました。不調となりました。</li> <li>広報で7月号から9月号にかけて特集記事を掲載し、古戦場公園再整備事業をPRしました。</li> </ul>			

主要事業進捗状況報告書

事業名	Nーバス購入事業			予算額（千円）	33,827
担当部課等名	くらし文化部安心安全課			負担行為済額（千円）	33,688
事業概要	平成20年5月に購入したNーバスが、今年度で15年を経過して、距離数が80万キロを超える見込みから、新しく買い換えをする時期になっています。 本市はゼロカーボンシティ宣言を行っており、より環境に配慮する必要があることからEVバスを購入します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	139
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・車両購入に向けた契約手続き	・打ち合わせ	・バス運行用機器設置	・納車	
実施内容	・4月28日に仮契約、5月12日の第1回市議会臨時会にて可決、5月15日で本契約を実施しました。	・3月22日までに納品できるようスケジュールを再確認しました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	旧香流苑清算事業			予算額（千円）	677,062
担当部課等名	くらし文化部環境課			負担行為済額（千円）	170,214
事業概要	旧香流苑の解体撤去工事を行い、共有となっている尾張旭市の持ち分を買収します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	506,848
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・契約事務	・工事説明	・工事開始 ・財産取得議案提出 ・仮契約、本契約	・工事継続 ・財産取得支払、登記	
実施内容	・香流苑解体撤去工事を㈱前田産業名古屋支店と549,668,900円で、香流苑解体撤去工事施工監理業務委託を㈱環境施設コンサルタントと14,630,000円で令和5年6月19日に契約を締結しました。	・地元住民に対し、7月に地域説明会を4回実施しました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	卯塚墓園整備事業			予算額（千円）	6,985
担当部課等名	くらし文化部環境課			負担行為済額（千円）	4,620
事業概要	卯塚墓園の南側街区に、第3期整備として芝生墓地を中心とした墓園を整備するにあたり、実施設計業務を実施します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	2,365
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・契約事務	・設計継続	・設計継続	・設計完了	
実施内容	・第3期卯塚墓園整備工事実施設計業務委託契約を令和5年6月19日 株式会社都市計画研究所と4,620,000円で締結しました。	・現況を把握し、区画数などの基本設計の見直しを実施しました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	保健センター外壁補修事業			予算額（千円）	15,805
担当部課等名	福祉部健康推進課			負担行為済額（千円）	13,750
事業概要	保健センター外壁にあるタイルの浮きや割れについて、外壁の劣化が進行する前に補修工事を実施します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	2,055
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・工事発注	・現地調査、打合せ	・工事施工	・工事完了	
実施内容	・6月15日(木)に(有)東海ブルーフトと13,750,000円で工事請負契約を締結しました。	・現地調査及び補修工事に向けた日程調整等の打合せを行いました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	宮前3号線舗装修繕事業			予算額(千円)	10,000
担当部課等名	建設部土木課			負担行為済額(千円)	4,566
事業概要	市道を適切に維持管理するため、損傷の著しい路線を順次修繕していきます。			執行済額(千円)	0
				残額(千円)	5,434
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	
実施スケジュール	・工事発注	・工事完了			
実施内容	・令和5年6月14日に(株)加藤組と4,708,000円で工事請負契約を締結しました。	・令和5年9月12日に工事変更請負契約を締結(141,900円減額)しました。 ・令和5年9月29日に工事が完了しました。			


主要事業進捗状況報告書

事業名	雁又泥亀首1号線道路改良事業			予算額(千円)	157,007
担当部課等名	建設部土木課			負担行為済額(千円)	126,953
事業概要	愛知県の基幹災害拠点病院に位置付けられている愛知医科大学病院への良好なアクセスを確保するため、道路改良を実施します。			執行済額(千円)	74,173
				残額(千円)	30,054
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています(決算時点とは異なります)。	
実施スケジュール	・土地売買契約 ・工事発注	・所有権移転完了 ・工事着工	・工事施工	・工事完了	
実施内容	・令和5年5月31日に愛知医科大学と36,333,886円で土地売買契約を締結しました。	・令和5年7月26日に所有権移転が完了しました。 ・令和5年7月27日に(株)成瀬組と87,780,000円で工事請負契約を締結しました。			

主要事業進捗状況報告書

事業名	せせらぎの径修繕事業			予算額（千円）	14,790
担当部課等名	建設部みどりの推進課			負担行為済額（千円）	0
事業概要	経年劣化に伴い老朽化した地下水路への漏水や井戸ポンプの劣化が発生しているせせらぎの径について、部分的な機能回復のため、改修工事を実施します。			執行済額（千円）	0
				残額（千円）	14,790
	第1四半期 ※令和5年6月頃の状況を説明しています。	第2四半期 ※令和5年9月頃の状況を説明しています。	第3四半期 ※令和5年12月頃の状況を説明しています。	第4四半期 ※令和6年3月頃の状況を説明しています（決算時点とは異なります）。	
実施スケジュール	・工事発注に向けた調整事務	・予算執行準備	・予算執行事務	・工事着手及び完了	
実施内容	・工事発注に向けた準備をしました。	・設計書等の準備を行いました。			

参考資料：岩作旧市街地狭あい道路整備事業

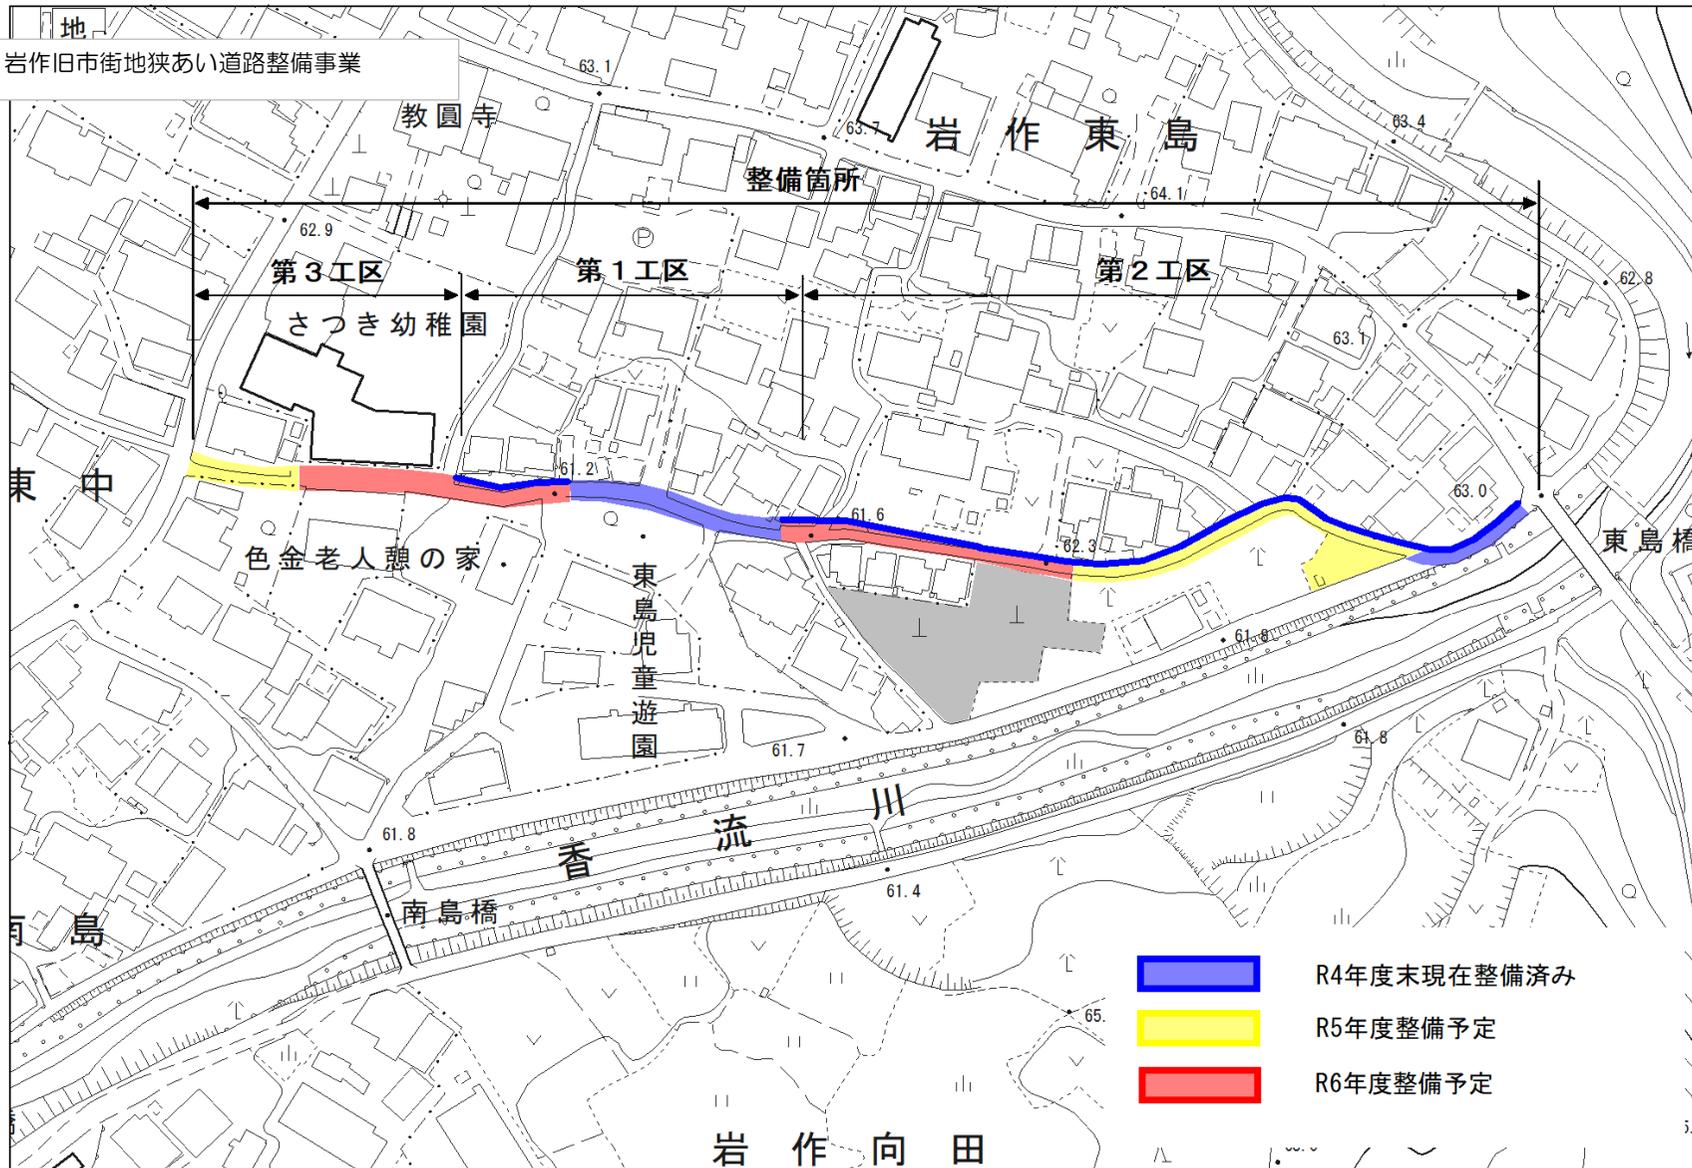

1/1,500

0m 25m 50m 75m 100m
