

古戦場公園再整備事業(史跡長久手古戦場ガイダンス施設 建設工事及び展示制作業務)の進捗について

令和6年6月6日(木) 令和6年第2回定例会
総務くらし建設委員会所管事務調査 生涯学習課資料

1 「史跡長久手古戦場ガイダンス施設建設工事」の進捗について

(1) 工事概要

国指定史跡長久手古戦場を保護継承するため、学びの場、体験の場及び交流の場の拠点となるガイダンス施設を整備する。令和6年度中に建築工事、令和7年度に外構工事を行い、令和8年3月末にオープン予定。延床面積約807㎡。

ア 契約金額 金5億3,889万円

イ 契約者 株式会社宇佐美組名古屋支店

(2) 進捗状況

ア 4月に工事用仮囲いを設置し、ガイダンス施設建設予定地にあった東屋などの既存構造物を撤去済み。

イ 5月に石垣擁壁の撤去を完了し、6月から掘削工事に着手予定。


(3) 工事発生土の搬出先変更に伴う契約金額の増額

当初、建設工事発生土(約5,500㎡)を香流苑跡地(処分費不要)に搬出する予定であったが、工事着手後に土質検査を行ったところ、埋め戻し土として、相応しくない第4種建設発生土であることが判明した。これに伴い、発生土の搬出先の変更に加え、処分費の計上が必要となり、工事請負代金が増加することとなった。

ア 変更増額見込み金額 約5,000万円

イ 設計変更に伴う予算は、請負残額で対応することが可能。

ウ 令和7年第1回市議会定例会で変更契約の議案を上程予定。

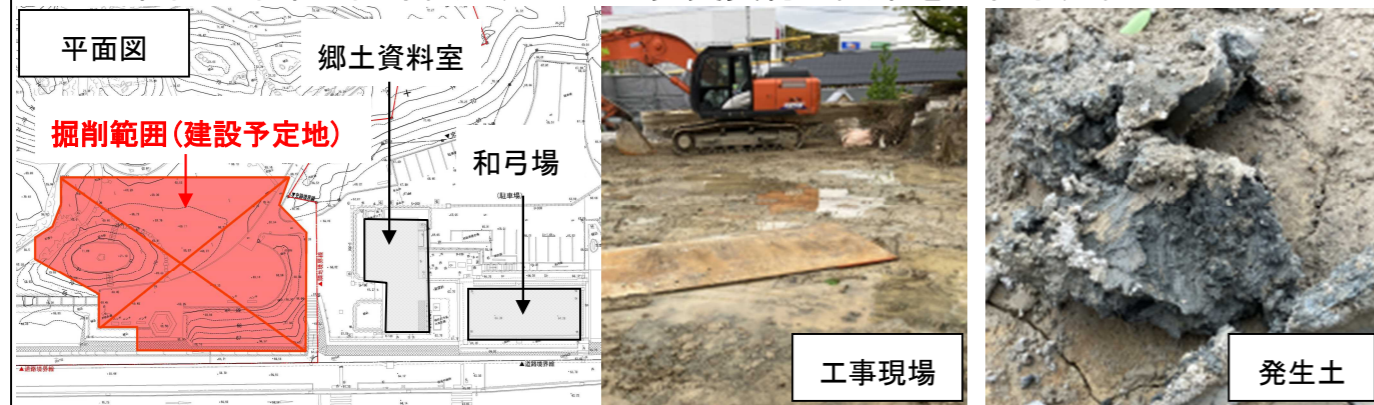

2 「展示制作業務」について

(1) 業務概要

「小牧・長久手の戦いの全容を紐解く」をテーマに、ガイダンス映像やプロジェクションマッピングなど、来館者が長久手合戦時の史跡地の距離感や臨場感を体感できるデジタルコンテンツを制作するほか、ガイダンスシアター、展示ケース等の什器及び映像・音響設備の設置を行う。令和6～7年度の2か年で委託予定。

(2) 予算額

委託事業費 3億120万円(継続費)

(令和6年度:2,200万円、令和7年度:2億7,920万円)

《内訳》ソフト 1億5,108万円

模型・複製制作 4,123万円

映像ソフト・情報コンテンツ制作 1億 536万円

解説パネル等 449万円

ハード 1億5,012万円

造作工事(ガイダンスシアター等) 6,102万円

展示ケース制作 5,112万円

映像・音響設備 3,187万円

展示照明設備 611万円

(3) 類似施設の状況

施設名称	開館年月日	延床面積	展示制作費用
れきしるこまき	H31. 4. 25	999 m ²	2億7,000万円
あいち朝日遺跡ミュージアム	R2. 11. 22	1,954 m ²	2億2,200万円
豊田市博物館	R6. 4. 26	7,800 m ²	17億9,300万円
岐阜関ヶ原古戦場記念館	R2. 10. 21	5,862 m ²	8億6,000万円
